

# Überblick Förderprojekt 1

Stand 19.05.2021


---

## Cluster 1

Klevendeich  
Haseldorf  
Haselau

gebaute Kilometer: 36 km

vor Baustart: 812 HA (941 Aufträge)  
aktuell: 930 HA /1076 Aufträge)  
freigeschaltete Kunden: 701

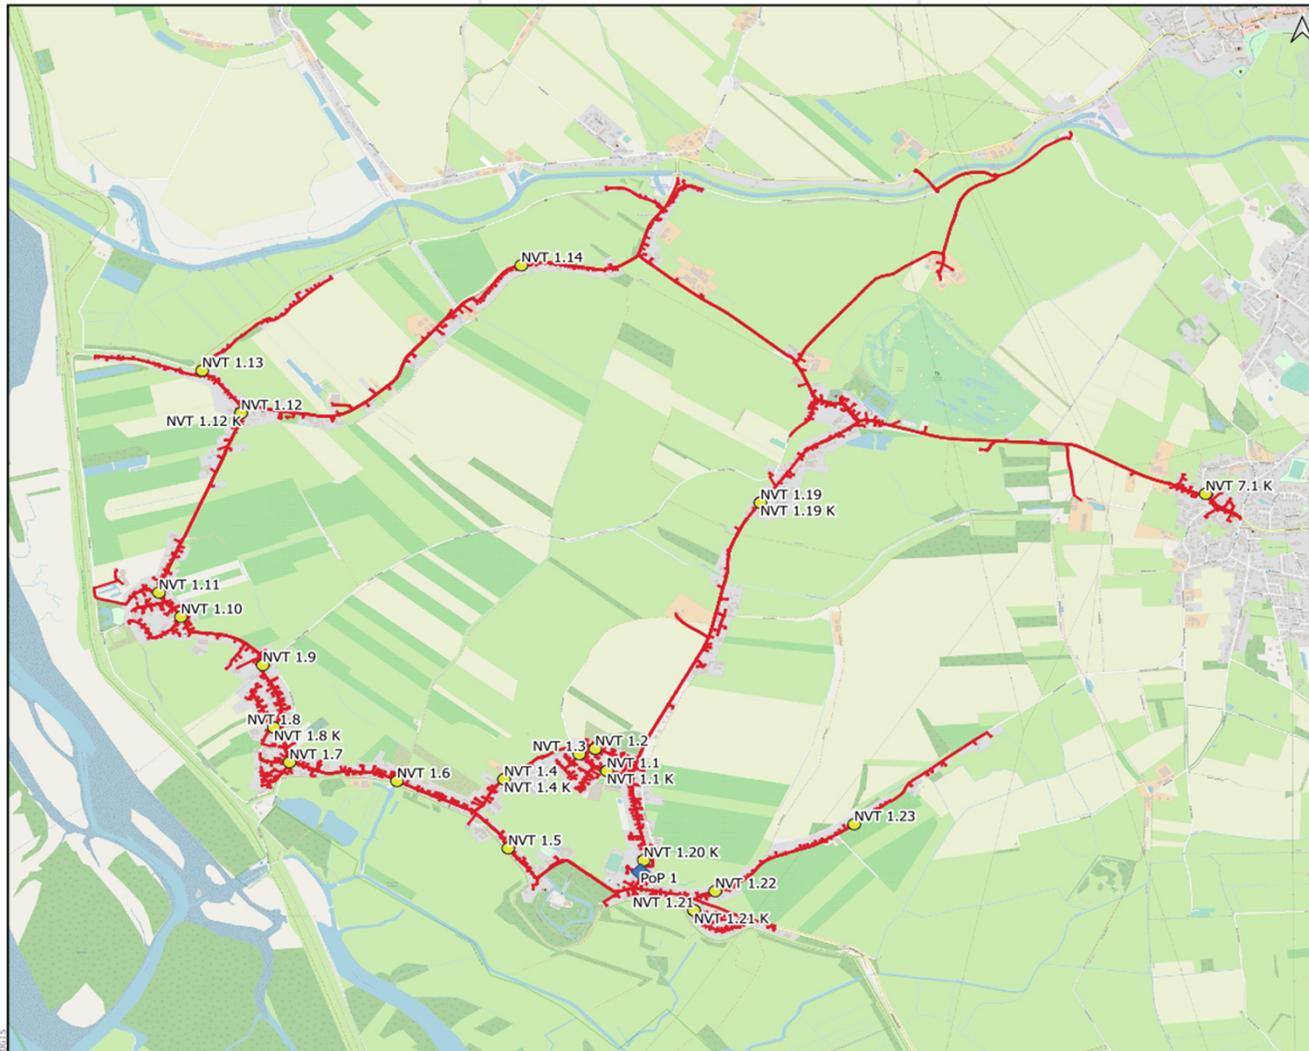

## Cluster 2

Neuendeich  
Seester  
Seestermühe  
Raa- Besenbek

gebaute Kilometer: 44 km

vor Baustart: 914 HA/ 966 Aufträge  
aktuell: 963 HA/1085 Aufträge

=> Ausbau der NVT-Bereiche POP 3 Seester bis zu den Sommerferien beendet

=> Ausbau der NVT-Bereiche POP 2 Seestermühe Richtung Neuendeich bis Ende der Sommerferien





### **Cluster 3**

Klein Nordende  
Groß Nordende  
Heidgraben

gebaute Kilometer Trasse: 30 km

vor Baustart: 351 HA / 382  
aktuell: 356 HA / 389

- Tiefbau beendet
- aktuell: Kabelzug- und Montage der BB-Strecken und NVT-Bereiche, Einblasarbeiten der Hausanschlüsse

=> erste Kunden können Anfang August freigeschaltet werden



## Cluster 4

Ellerhoop

Einigung mit den Stadtwerken  
Barmstedt  
Wegfall vieler weißer Adressen=> ca.  
50 können vom ZBMG noch  
ausgebaut werden

Planungsprozess ist angelaufen,  
Genehmigung wurde bei der UNB  
eingereicht



### **Cluster 5**

Moorrege  
Appen  
Heist

gebaute Trasse:

- Bohrstrecken 8 km
- Offener Tiefbau in Heist ( Großer Ring, Heistmer Weg aktuell)

- Termine für die Hausbegehungen

aktuell: 400 HA/ 425 Aufträge (noch bis zum 28. Mai 2021)





# Überblick Förderprojekt 2

Stand 19.05.2021

---

# Ausgangslage

---

- In unseren Verbandsgemeinden wurden zusätzliche weiße Flecken identifiziert, die nicht Bestandteil des ersten Förderprojekt waren:
  - Hinweise von Bürgern
  - Recherche ZBMG in Abstimmung mit dem BKZ.SH
- Aufgrund der Massen wurde ein zweites Förderprojekt eingereicht und vom Fördermittelgeber genehmigt.
  - ca. 1.273 neue weiße Flecken
  - ca. 796 zusätzliche graue Flecken

- Markterkundungsverfahren wurde durchgeführt
- Förderantrag bei der atene KOM wurde gestellt und genehmigt
- Förderantrag Kofinanzierung beim Land wurde gestellt und genehmigt
- EU-weite Ausschreibung
  - Betrieb (kurz vor Zuschlagserteilung)
  - Planung (kurz vor Zuschlagserteilung)

# Wie geht es weiter?

---

- Nach Zuschlagserteilung erfolgt die Netz- und Genehmigungsplanung durch das Planungsbüro
  - Vermarktung
  - Erstellen von Leistungsverzeichnissen, Einteilung der Cluster
  - Ausschreibung Tiefbau
  - Geplanter Baustart FP2 Anfang 2022 (evt. früher, abhängig von der Planung / Ausschreibung Tiefbau)
  - Bauaktivitäten größtenteils in Cluster 3 und 5. In Cluster 1 und 2 nur vereinzelt (z.B. Außenlagen, die im FP1 nicht berücksichtigt wurden).
  - Im Förderprojekt 1 wurden bereits Reserven (Rohre) für das Förderprojekt 2 geplant und verbaut.
-

# Zahlen

	Appen	Groß Nordende	Haselau	Haseldorf	Heidgraben	Heist	Klein Nordende	Moorrege	Neuendeich	Raa-Besenbek	Seester	Seestermühe	gesamt
weiß <sup>1</sup>	95	4	432	492	126	52	52	238	108	176	409	390	<b>2.574</b>
grau <sup>1</sup>	319	138	0	181	120	123	295	350	91	41	0	0	<b>1.658</b>
weiß (neu) <sup>3</sup>	194	87	2	3	269	153	136	424	1	1	2	1	<b>1.273</b>
grau (neu) <sup>2</sup>	135	9	0	0	183	86	192	191	0	0	0	0	<b>796</b>
schwarz <sup>2</sup>	808	0	0	0	227	199	525	324	0	0	0	0	<b>2.083</b>
<b>Summe</b>	<b>1.551</b>	<b>238</b>	<b>434</b>	<b>676</b>	<b>925</b>	<b>613</b>	<b>1.200</b>	<b>1.527</b>	<b>200</b>	<b>218</b>	<b>411</b>	<b>391</b>	<b>8.384</b>


<sup>1</sup>Mastertabelle aus Förderprojekt 1 (Ellerhoop, Köln-Reisiek und Seeth-Ekholt wurden nicht berücksichtigt)

<sup>2</sup>Tabelle Abschätzung Förderprojekt 2


<sup>3</sup>Eingereicht bei der ateneKOM

<b>Gesamt</b>	<b>8.384</b>	<b>100%</b>
<b>Förderprojekt I</b>	<b>4.232</b>	<b>50%</b>
<b>Differenz</b>	<b>4.152</b>	
<b>Förderprojekt II</b>	<b>2.069</b>	<b>25%</b>
<b>Förderprojekt III*</b>	<b>2.083</b>	<b>25%</b>



\*oder eigenwirtschaftlich

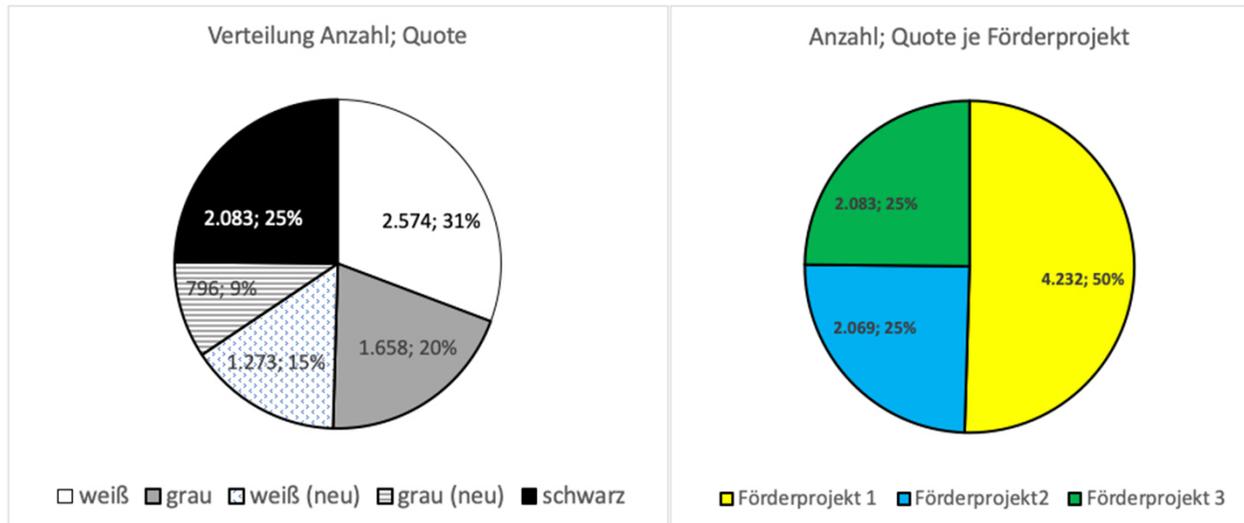

# Cluster 3

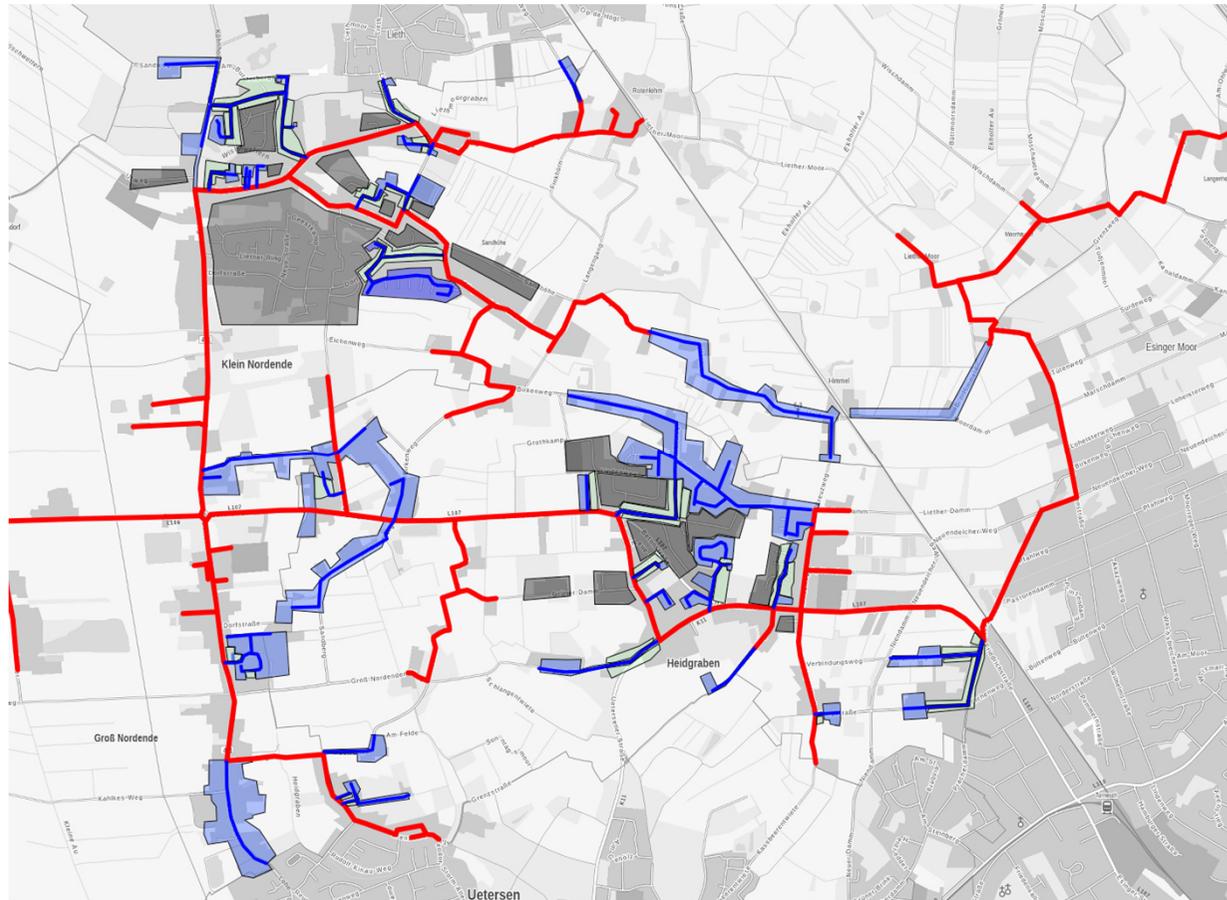

# Cluster 5

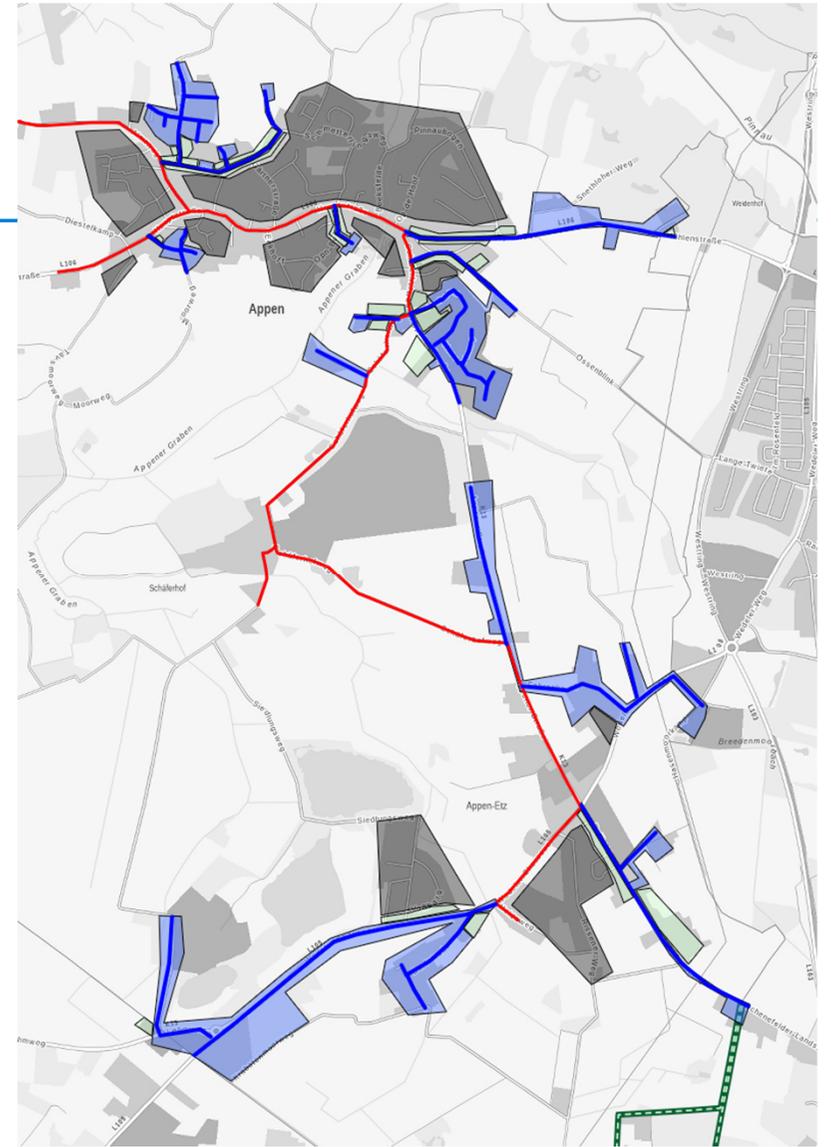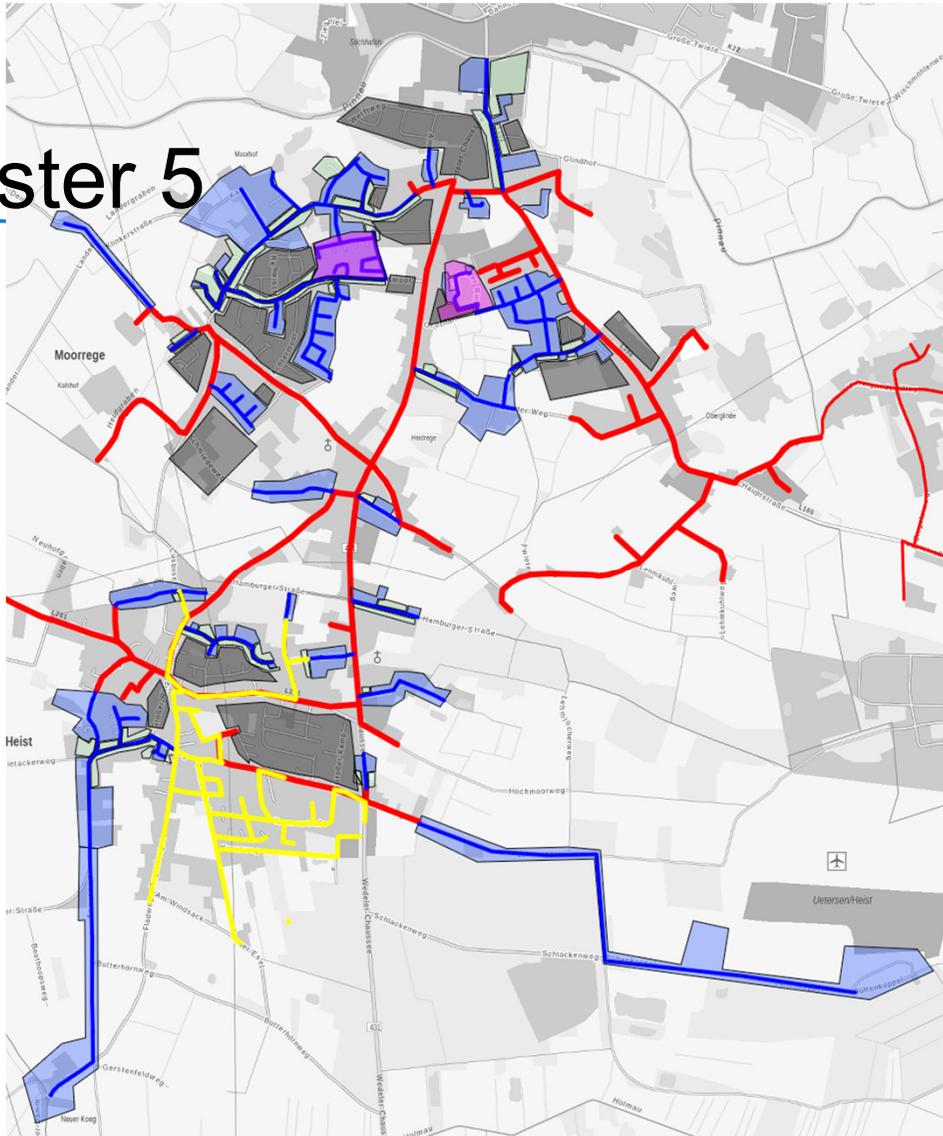

- Trasse Förderprojekt 1
- Annahme Trasse Förderprojekt 2
- Bestandsnetz
- weiß (neu)
- grau (neu)
- schwarz
- Glasfaser Telekom

# Überblick Förderprojekt 3 (!?)

Stand 19.05.2021

---

# Zahlen

	Appen	Groß Nordende	Haselau	Haseldorf	Heidgraben	Heist	Klein Nordende	Moorrege	Neuendeich	Raa-Besenbek	Seester	Seestermühe	gesamt
weiß <sup>1</sup>	95	4	432	492	126	52	52	238	108	176	409	390	<b>2.574</b>
grau <sup>1</sup>	319	138	0	181	120	123	295	350	91	41	0	0	<b>1.658</b>
weiß (neu) <sup>3</sup>	194	87	2	3	269	153	136	424	1	1	2	1	<b>1.273</b>
grau (neu) <sup>2</sup>	135	9	0	0	183	86	192	191	0	0	0	0	<b>796</b>
schwarz <sup>2</sup>	808	0	0	0	227	199	525	324	0	0	0	0	<b>2.083</b>
<b>Summe</b>	<b>1.551</b>	<b>238</b>	<b>434</b>	<b>676</b>	<b>925</b>	<b>613</b>	<b>1.200</b>	<b>1.527</b>	<b>200</b>	<b>218</b>	<b>411</b>	<b>391</b>	<b>8.384</b>


<sup>1</sup>Mastertabelle aus Förderprojekt 1 (Ellerhoop, Köln-Reisiek und Seeth-Ekholt wurden nicht berücksichtigt)

<sup>2</sup>Tabelle Abschätzung Förderprojekt 2


<sup>3</sup>Eingereicht bei der ateneKOM

<b>Gesamt</b>	<b>8.384</b>	<b>100%</b>
<b>Förderprojekt I</b>	<b>4.232</b>	<b>50%</b>
<b>Differenz</b>	<b>4.152</b>	
<b>Förderprojekt II</b>	<b>2.069</b>	<b>25%</b>
<b>Förderprojekt III*</b>	<b>2.083</b>	<b>25%</b>



\*oder eigenwirtschaftlich

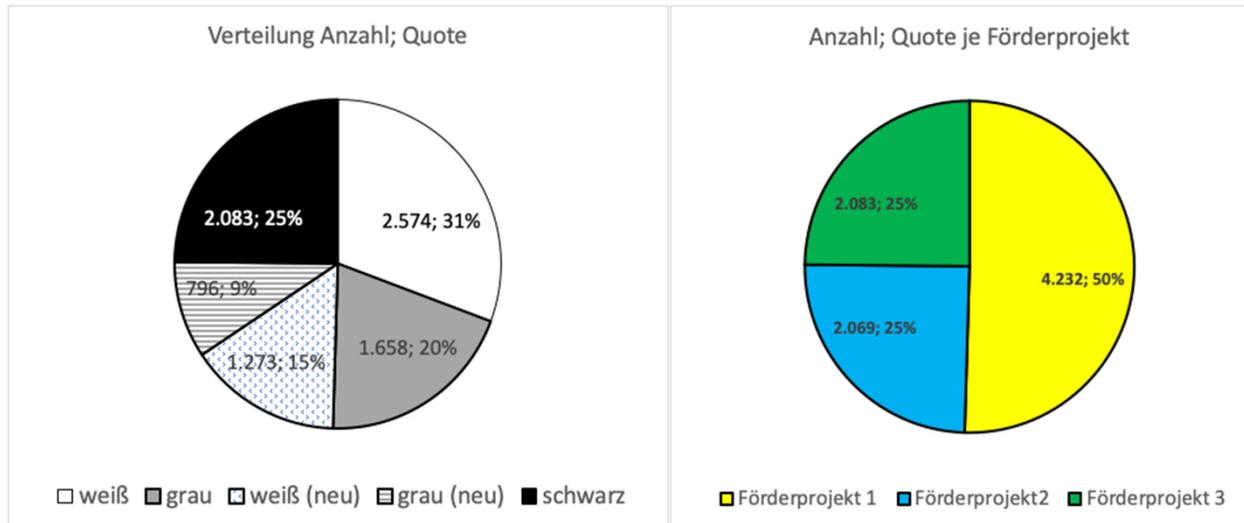

# Cluster 3

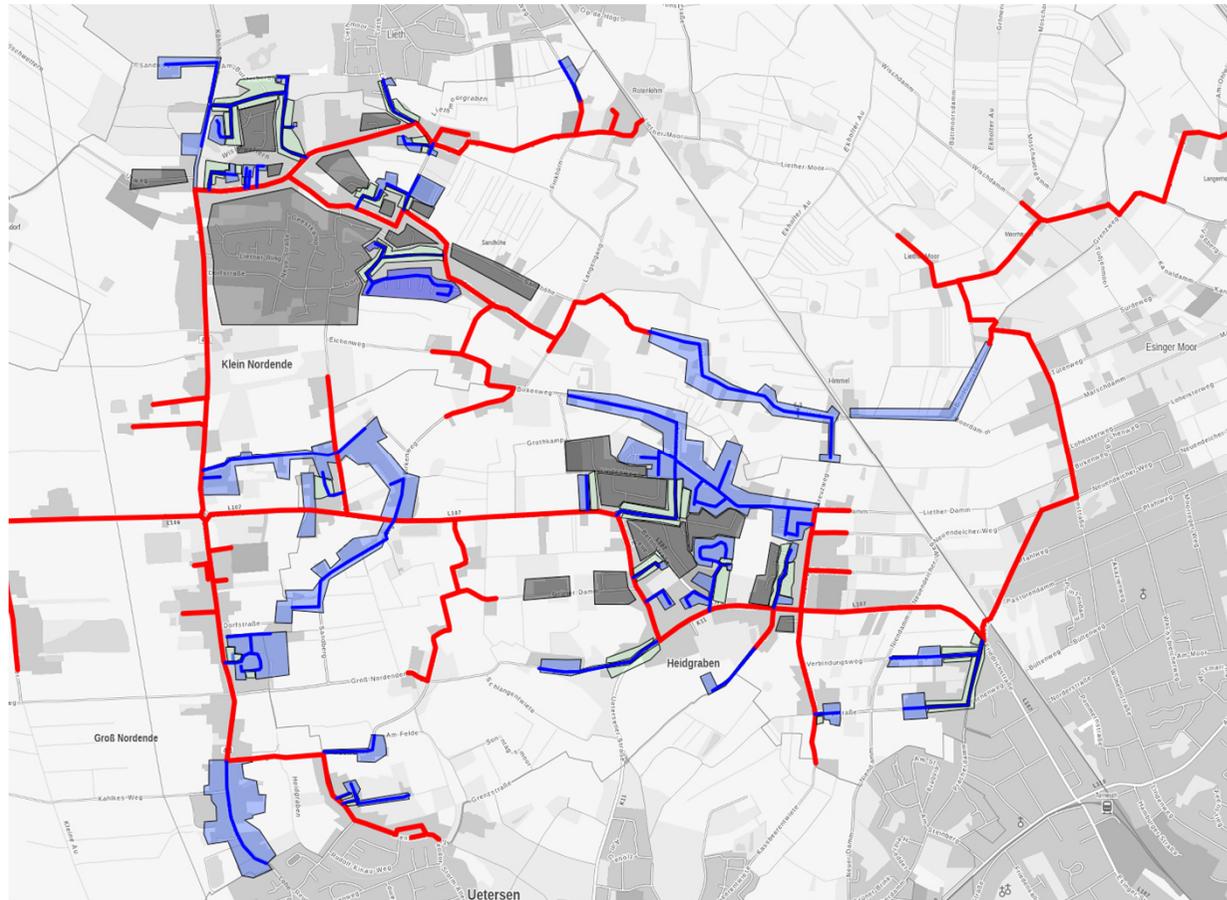

# Cluster 5

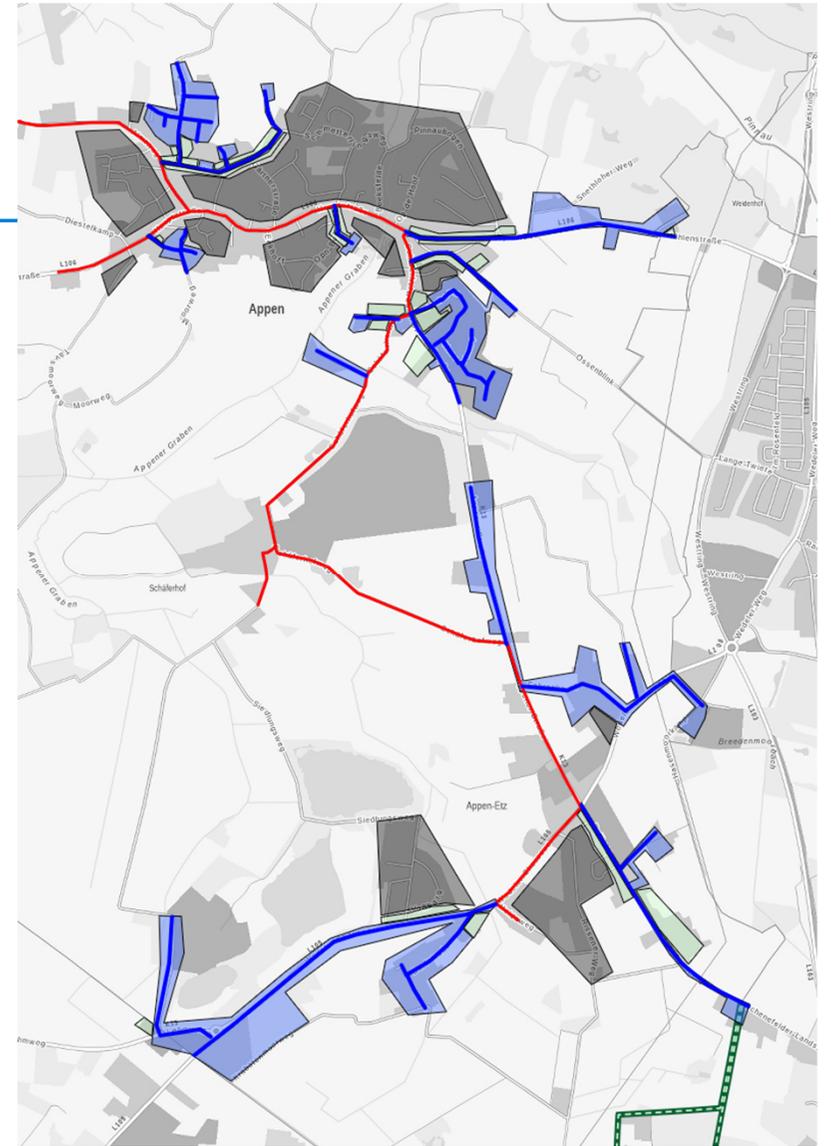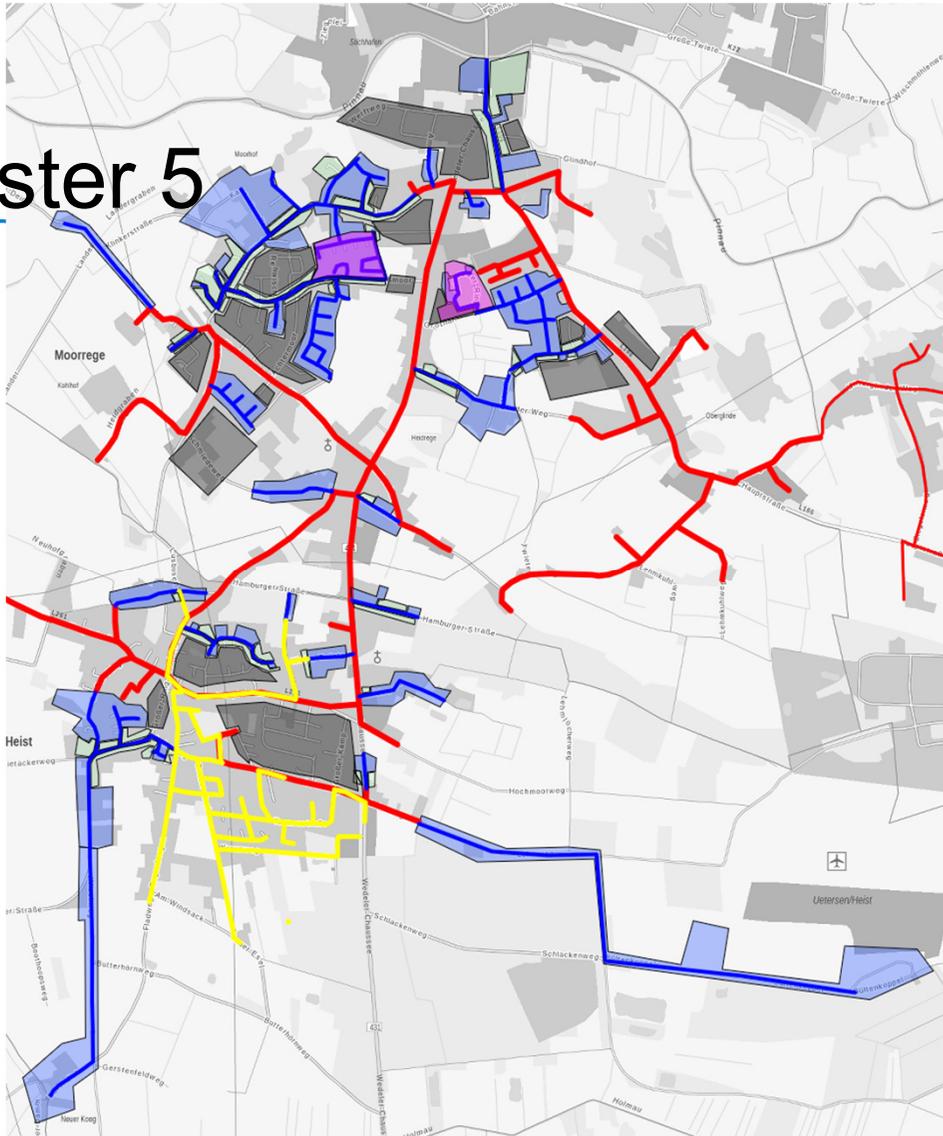

- Trasse Förderprojekt 1
- Annahme Trasse Förderprojekt 2
- Bestandsnetz
- weiß (neu)
- grau (neu)
- schwarz
- Glasfaser Telekom
